


V2H充放電設備の設置が完了したことを確認するため、要部写真を提出する必要があります。
 応募要領 5-25. 5-26. 要部写真の提出資料にある要部写真番号 8 についての補足資料になります。
 メーカーおよび型式により、**確認できるモニターやリモコンの位置が異なります**ので、事前に確認してください。

	写真番号	申請した内容に基づく撮影項目	撮影箇所の説明・留意点
電圧・放電確認	7	V2H充放電設備側の定格電圧の確認	V2H充放電設備側の定格電圧をテスター等で測定していることが確認できること。 電圧測定値が確認できること。
	8	放電確認	放電時の稼働状況を表示しているモニターなどの画面を撮影してください。
	9	三相の相回転	V2H充放電設備側で正回転であることが確認できること。

□ V2H充放電設備本体にモニターがある場合

本体に搭載されているモニターで、「給電」もしくは「放電」が表示されている状態の写真

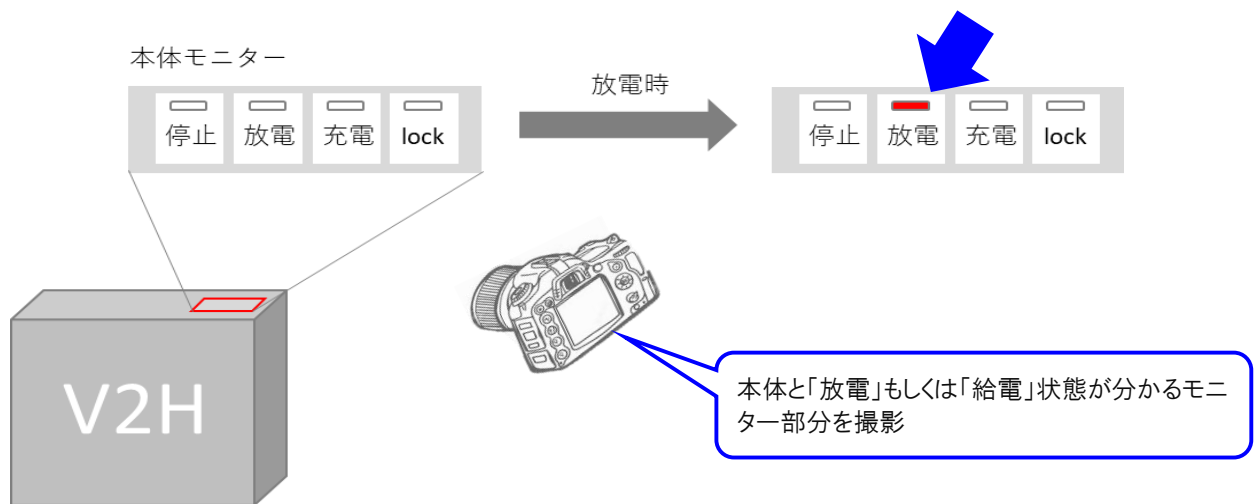

□ V2H充放電設備本体とは別に、室内などのリモコンがある場合

リモコン画面で、「給電」もしくは「放電」と表示されている状態の写真

